

这是一个短暂的时期。很快进入震荡期，这时成员之间互相还不了解，时常感到困惑，有时甚至会产生敌对心理。接下来在强有力的领导下，团队的工作方式在正规期得以统一。随后团队进入表现期，以最大成效开展工作，直至项目结束，项目团队解散。项目团队各阶段的团队精神、工作绩效、调控力度的示意图如图 8-8 所示。

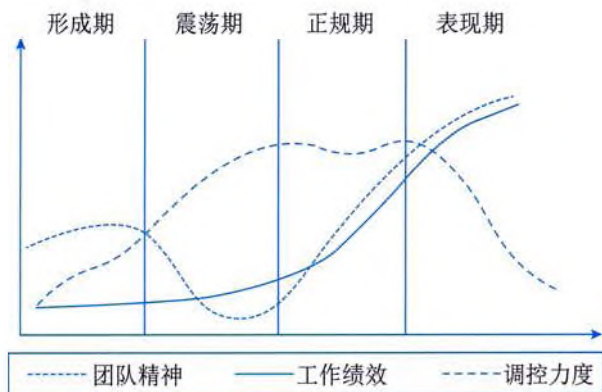


图 8-8 项目团队各阶段示意图

#### 8.7.4 管理项目团队

管理项目团队是指跟踪个人和团队的绩效，提供反馈，解决问题和协调变更，以提高项目的绩效。项目经理必须观察团队的行为、管理冲突、解决问题和评估团队成员的绩效。

一旦项目成员被分配到项目中，项目经理有两种方法来最有效地使用项目团队中的成员，即资源负荷和资源平衡。

资源负荷是指在特定的时间内，现有的进度计划所需要的各种资源的数量。如果在特定的时间内分配给某项工作的资源超出了项目的可用资源，则称为资源超负荷。资源超负荷本身就是一种资源冲突的现象，为了消除超负荷，项目经理可以修改进度表，尽量使资源得到充分的利用或者充分利用项目活动的时差，这种方法就叫做资源平衡。

资源平衡是一种延迟项目任务来解决资源冲突问题的方法，是一种网络分析法，它将以资源管理因素为主进行项目进度决策。资源平衡的主要目的是更加合理地分配使用的资源，使项目的资源达到最有效的利用，资源平衡的时候，资源的利用也就达到了最佳的状态。

#### 8.7.5 沟通管理

项目沟通管理的目标是及时而适当地创建、收集、发送、储存和处理项目的信息。项目经理的大部分时间花在沟通上，包括内部沟通和外部沟通。作为技术骨干的系统分析师，对内需要与项目团队和睦相处，协助项目经理做好技术管理工作；对外需要与用户进行良好的沟通，以便正确而快捷地获取用户需求，做好系统分析与设计工作。

沟通有正式沟通和非正式沟通之分。正式沟通是通过项目组织明文规定的渠道进行信息传递和交流的方式。它的优点是沟通效果好，有较强的约束力，缺点是沟通速度慢。非正式沟通是指在正式沟通渠道之外进行的信息传递和交流。这种沟通的优点是沟通方便，沟通速度快，
