

源管理的主要过程包括编制人力资源计划、组建项目团队、项目团队建设、管理项目团队和沟通管理。

8.7.1 编制人力资源计划

人力资源计划涉及决定、记录和分配项目角色、职责及报告关系的过程，描述项目的角色和职责的工具主要有层次结构图、矩阵图和文本格式的角色描述。文本格式用来详细描述团队成员的职责，提供的信息主要有职责、权力、能力和资格。

1. 组织结构图

在生成项目组织结构图之前，高层管理者和项目经理必须明白什么类型的人是真正保证项目的关键人物，他们需要什么样的技能。例如，如果需要找一些优秀的系统分析师，则人力资源计划就需要反映这个需求；如果项目成功的关键是需要一流的项目经理和被人尊敬的团队领导，人力资源计划也要重点描述。

组织结构图通常描述为一个层次结构。例如，图 8-7 就是一个项目的组织结构图。

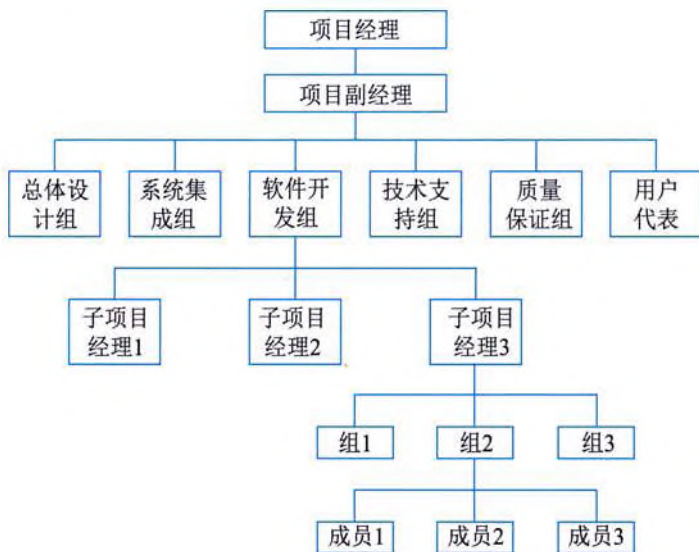


图 8-7 组织结构图示例

2. 责任分配矩阵

项目工作一旦分解成可管理的元素，项目经理就可以给组织单元分配任务了，主要是基于“适合优先”的原则来分配任务，这个过程可以用组织分解结构（Organizational Breakdown Structure, OBS）来进行概念化的描述。OBS 类似于 WBS，是一种用于表示组织单元负责哪些工作内容的特定的组织图形。它可以先借用一个通用的组织图形，然后针对组织或分包商中特定部门的单元进行逐步细分。

在制作完 OBS 之后，就可以开发责任分配矩阵（Responsibility Assignment Matrix, RAM）了。RAM 为项目工作（用 WBS 表示）和负责完成工作的人（用 OBS 表示）建立一个映射关
